



V. 젊은이가 돌아오는 부자 농어촌



신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
계속	예산	임기내	경주시	이행후 계속추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 내남면 상신리 800번지 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2025년(8년간)
- 총사업비 : (계획) 610억원 / (추진) 680억원
- 사업내용
 - (농업디지털혁신) 스마트농업교육센터, 임대형스마트팜, 시험포장
 - (환경친화적농업) 친환경식물영양센터, 친환경축산관리실
 - (농촌융복합산업) 농산물종합가공센터, 치유농업관, 체험정원
 - (농업지원시설) 업무동, 연구교육동, 웰컴팜 교육지원센터
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
부지매입 기반시설공사 테스트베드교육장 실증시험포장 예산확보	기반시설공사 스마트농업교육센터 경영실습임대농장 실증시험포장 농산물가공센터 식물영양센터 농기계임대사업소 예산확보	업무동 연구교육동 체험정원 스마트농업교육센터 실증시험포장 예산확보	업무동 연구교육동 체험정원	-

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구분	확보액					집행액					비고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	51,216	15,006	9,722	17,018	9,470	34,122	12,002	6,875	9,852	5,393	
국비	11,896		2,700	4,950	4,246	7,504		1,471	2,854	3,179	
도비	2,555		155	2,263	137	272		155	107	10	
시비	36,765	15,006	6,867	9,805	5,087	26,346	12,002	5,249	6,891	2,204	
기타	0					0					

□ **추진현황 : 이행후 계속추진**

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 60%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ **추진경과 및 향후계획**

2022	2023	2024	2025	2026
부지매입 기반시설공사 테스트베드교육장 실증시험포장 예산확보	기반시설공사 스마트농업교육센터 경영실습임대농장 실증시험포장 농산물가공센터 식물영양센터 농기계임대사업소 웰컴팍교육지원센터 예산확보	스마트농업교육센터 농산물가공센터 농기계임대사업소 업무동 연구교육동 실증시험포장 웰컴팍교육지원센터 예산확보	업무동 연구교육동 웰컴팍교육지원센터 스마트농업교육센터 체험정원	-

- 2021. 11. : 기반시설공사(경지정리, 도로개선 등) 착공
- 2022. 8. : 부지매입 100% 완료
- 2022. 12. : 테스트베드 교육장, 아열대 시험온실 준공
- 2023. 8. : 기반시설공사 준공
- 2023. 10. : 친환경식물영양센터 준공
- 2024. 4. : 전기인입공사, 농산물종합가공센터 준공
- 2024. 5. : 경영실습 임대농장 준공
- 2024. 6. : 아열대농업관, 치유농업관 준공
- 2024. 7. : 농기계임대사업소 준공
- 2025. 1. : 스마트농업 교육센터 준공
- 2025. 12. : 웰컴팍 교육지원센터, 업무동(과학영농실증교육관) 준공

관 련 부 서	주관부서	농업진흥과	과장 이성미(8681)	농업시설TF팀장 하수진(2937)	담당자 우민정(2939) 담당자 박지영(2938)
	협조부서	농업진흥과	과장 이성미(8681)	농기계팀장 장송민(8736)	담당자 배성연(2254)
		농업기술과	과장 김정필(8710)	과학영농팀장 양승우(8695)	담당자 김기영(8696)

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
계속	예산	임기내	경주시	이행후 계속추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 총사업비 : 10억원(국비 5, 도비 1.5, 시비 3.5)
- 사업내용
 - 작목별 농업 전문인력 양성 과정 체제 확립
 - 단기과정 : 수요에 따른 시기별, 작목별, 특별과정 개설 과정 운영
- 사업주체 : 경주시

□ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액					비고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	722	0	248	270	204	609	0	248	270	91	
국비	218		154	42	22	205		154	42	9	
도비	35			24	11	29			24	5	
시비	469		94	204	171	375		94	204	77	
기타	0					0					

□ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 65%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

○ 농업대학 졸업생 현황(정규과정)

구분	입학생	졸업생	졸업률
2022년	121명	112명	92.5%
2023년	115명	109명	94.7%
2024년	121명	추진 중	추진 중

○ 경주농업대학 교육 추진 중

- 정규과정 : 121명 (귀농귀촌 45명, 치유농업 40명, 사과 36명)
- 단기과정(농업경영마케팅) 교육 6월 완료(33명)
- 단기과정(토양) 교육 6월 완료(31명)

※단기과정은 실수요에 따라 진행(졸업률 100%)

○ 새해농업인실용교육 1월 완료(1,552명 이수)

※ 계획인원(1,080명) 대비 144% 이수

○ 품목별(토종별) 농업인 교육 1월 완료(23명 이수)

○ 품목별(팥 작목회) 농업인 교육 3월 완료(45명 이수)

○ 예비 귀농인을 위한 기초 교육 8월 예정(30명)

□ 향후계획

- ICT 스마트팜 이론·실습교육을 위한 교육기반시설 구축
- 미래 농업 전문교육 발굴을 위한 수요조사 및 발굴(용역)
- 체계화, 고도화된 농업전문교육 수행으로 농업전문인력 양성

관련부서	주관부서	농업진흥과	과장 이성미(8681)	교육훈련팀장 이효석(8689)	담당자 하승희(8690)

특작농가 자동화 온실 및 ICT기반시설 보급

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
계속	예산	임기내	경주시	이행후 계속추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 4,000백만원(시비 2,000, 자부담 2,000)
- 사업내용 : ICT기반구축을 위해 필요한 정보시스템 및 시설장비 지원
- 사업주체 : 경주시
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
스마트팜 조성 6,600 m^2	스마트팜 조성 6,600 m^2	스마트팜 조성 6,600 m^2	스마트팜 조성 6,600 m^2	스마트팜 조성 6,600 m^2

□ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액					비고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	11,100	8,700	800	800	800	10,392	8,700	662	786	244	
국비	1,740	1,740	-	-	-	1,740	1,740	-	-	-	
도비	783	783	-	-	-	783	783	-	-	-	
시비	3,027	1,827	400	400	400	2,673	1,827	331	393	122	
기타	5,550	4,350	400	400	400	5,196	4,350	331	393	122	

□ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 100%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2022년 : 8개소, 1ha, 사업비 662백만원 (보조금 331, 자부담 331)
 - ICT복합환경제어시스템 7,000㎡, ICT단순환경제어시스템 3,000㎡ 및 내재해형하우스 10,740㎡, 고설재배시설 1,400㎡, 다겹보온커튼 12,478㎡, 양액재배시설 1식
- 2023년 : 12개소, 3ha, 사업비 786백만원 (보조금 393, 자부담 393)
 - ICT복합환경제어시스템 24,000㎡, ICT단순환경제어시스템 6,000㎡ 및 레일보온시설 3,251㎡, 방열순환팬 92대, 다겹보온커튼 3,086㎡, 내재해형하우스 4,256㎡, 양액재배시설 2식, 농업용난방시설 1식, 무인방제시설 1식, 고설재배시설 1식
- 2024년 : 6개소, 1.8ha, 사업비 800백만원 (보조금 400, 자부담 400)
 - (사업완료) 2개소, 1ha : ICT복합환경제어시스템 1ha, 고설재배시설 7,289㎡, 내재해형하우스 2,640㎡
 - (추진중) 4개소, 0.8ha : ICT환경제어시스템 0.8ha, 내재해형하우스 4,464㎡, 고설재배시설 1식 등

□ 향후계획

- 2024. 4. : 사업추진 및 부정수급 예방을 위한 현장 확인
- 2024. 5. : 적기 사업 추진 및 지침 준수 확인을 위한 이행점검
- 2024. 8. : 25년도 사업자 발굴을 위한 홍보 및 연계 가능 사업 안내
- 2024. 11. : 사업 완료 및 정산

□ 문제점 및 대책

- 현대화된 연동하우스에 적용이 가능한 사업으로 농자재 가격 상승으로 연동하우스 설치 비용이 증가하여 사업추진이 어려움
- 연동하우스 설치면적 확대를 위한 관련 예산 확보

관련부서

주관부서	농업정책과	과장 고영달(6270)	원예산업팀장 김현우(6995)	담당자 이수미(6278)
------	-------	--------------	------------------	---------------

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
신규	예산	임기내	경주시	이행후 계속추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년 (3년)
- 총사업비
 - (계획) 15개소 / 69억원(도비 24, 지방비 24, 자부담 21)
 - (추진) 20개소 / 82.5억원(도비 24, 지방비 33.5, 자부담 25)
- 사업내용 : 경주형 연동하우스 및 보급형 스마트팜 확대보급
- 5개소/년 × 3년간 = 15개소 (보급형스마트하우스 4.5ha 조성)
- 사업주체 : 민간
- 연도별 사업목표

2022	2023	2024	2025	2026
예산확보	사업추진 : 5개소	사업추진 : 5개소	사업추진(완료) : 5개소	

□ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액					비고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	5,950	0	0	3,650	2,300	0	0	0	0	0	
국비	0					0					
도비	1,600			800	800	0					
시비	2,545			1,745	800	0					
기타	1,805			1,105	700	0					

□ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 60%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과

2022	2023	2024	2025	2026
예산확보	사업추진 : 10개소	사업추진 : 7개소	사업추진 : 5개소 예정	

- ' 23. 1. ~ 12. : 경주형 연동하우스 확대보급(10개소, 3ha)
- ' 24. 1. ~ 2. : 2024년 추진계획 수립 및 사업대상자 공모
- ' 24. 3. ~ 5. : 사업대상자 선정(7개소) 및 사전교육 실시, 농가별 맞춤형 하우스 설계(도면, 자재내역 등)
- ' 24. 6. ~ 7. : 일상감사 및 교부결정, 입찰을 통한 시공사 선정, 사업 추진(7개소, 1.9ha)

□ 향후계획

- ' 24. 7. ~ 12. : 사업 추진완료 및 사업효과 평가(현장평가회), 2025년 추진계획 수립 및 예산 확보

관련부서	주관부서	농업기술과	과장 김정필(8710)	경제작물팀장 이승찬(8716)	담당자 김민영(8717)

38-3

축산농가 ICT를 접목한 자동화시설 보급

신규여부 계속	예산구분 예산	완료시기 임기내	사업주체 경주시	추진상황 이행후 계속추진
------------	------------	-------------	-------------	------------------

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년 (5년간)
- 총사업비 : 120억원(국비 22, 도비 4, 시비 10, 용자 60, 자부담 24)
- 사업내용 : 축산농가에 ICT(정보통신기술)를 접목한 자동화시설 지원
 - 환경관리 : 축사 내·외부환경 정보수집 및 원격 모니터링시설
 - 사양관리 : 로봇착유기, 자동급이기, 발정탐지기 등 자동화시설
- 연도별 추진목표 〈단위 : 개소〉

2022	2023	2024	2025	2026
자동화시설 20개소 지원	자동화시설 20개소 지원	자동화시설 20개소 지원	자동화시설 20개소 지원	자동화시설 20개소 지원

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액					집 행 액					비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	4,494	0	2,536	1,219	739	3,841	0	2,536	1,219	86	
국 비	1,083		680	274	129	954		680	274		
도 비	197		55	86	56	154		55	86	13	
시 비	613		179	250	184	459		179	250	30	
기 타	2,601		1,622	609	370	2,274		1,622	609	43	

□ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 50%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과

- 2022년도 : 자동화시설 39개소 지원 (2,536백만원)
 - 사양관리시설 : 38개소
 - 로봇착유기 3, 발정탐지기 17, 사료배합기 1, 자동급이기 17
 - 환경관리시설 : 환풍시설 1개소, 17백만원
- 2023년도 : 자동화시설 23개소 중 23개소 지원 (1,219백만원)
 - 사양관리시설 : 23개소
 - 자동급이기 20, 축산용체중기 1, 사료배합기 1, 내부환경관리기 1
- 2024년도 : 자동화시설 19개소 추진 중 (739백만원)
 - 사양관리시설 : 19개소
 - 자동급이기 18, 로봇착유기 1
 - 2024. 4. : 사업 대상자 선정
 - 2024. 6. : 1회 추경 예산확보(로봇착유기 1대)

□ 향후계획

- 2024. 7. ~ 12. : 사업추진 및 정산
차년도 사업 예비신청자 발굴 및 접수

관련부서	주관부서	축산정책과	과장 이동완(6290)	친환경축산팀장 김용배(6304)	담당자 손준호(6835)

신규여부 계속	예산구분 예산	완료시기 임기내	사업주체 경주시	추진상황 이행후 계속추진
------------	------------	-------------	-------------	------------------

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2026년 (5년간)
- 총사업비
 - (계획) 101.4억원 (국비 9, 도비 2.7, 시비 57, 자부담 32.7)
 - (추진) 109억원 (국비 9, 도비 2.7, 시비 54, 자부담 43.3)

○ 사업내용

- 품질 개선용 비타민제 및 IOT 기자재 지원(27억원)
- 조사료 가공유통시설 지원(39억원), 설비 증설 지원(18억원)
- 브랜드 가치 증대를 위한 홍보비용 지원(25억원)

○ 연도별 추진목표

〈단위 : 백만원〉

2022	2023	2024	2025	2026
3,020	770	770	770	770

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액					집 행 액					비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	8,766	0	4,940	1,040	2,786	6,723	0	4,940	1,040	743	
국비	900		900			900		900			
도비	270		270			270		270			
시비	4,263		1,850	770	1,643	3,363		1,850	770	743	
기타	3,333		1,920	270	1,143	2,190		1,920	270		

□ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 60%
- 2024년 추진목표 달성가능성 : 여

□ 추진경과(주요성과)

○ 2022년도

- 경주천년한우브랜드육성(TV 등 광고, 스포츠마케팅) : 500백만원
- 경주천년한우 고급육생산 및 IoT(사물인터넷) 번식효율 개선
 - 번식농가 비타민제 지원 : 360백만원(시비 180, 자부담 180)
 - 번식농가 CCTV 지원 : 180백만원(시비 90, 자부담 90)
- 조사료 가공시설 공사 착공 : 3,000백만원(국비 900, 도비 270, 시비 630, 자담 1,200)

○ 2023년도

- 경주천년한우브랜드육성(TV 등 광고, 스포츠마케팅) : 500백만원
- 경주천년한우 고급육생산 및 IoT(사물인터넷) 번식효율 개선
 - 번식농가 비타민제 지원 : 360백만원(시비 180, 자부담 180)
 - 번식농가 CCTV 지원 : 180백만원(시비 90, 자부담 90)
- 친환경개선제 제조시설 완료('23. 8.) : 900백만원(시비450, 자부담450)
- 조사료 가공시설(경주축협 TMR 사료공장) 준공('23. 8.)
- 23. 9. 우수축산물 브랜드 인증 획득(경주 천년한우 13년 연속)
- 23. 12. 축산물경진대회 수상(우수상)

○ 2024년도

- 경주천년한우브랜드육성(TV 등 광고, 스포츠마케팅) : 500백만원
- 경주천년한우 고급육생산 및 IoT(사물인터넷) 번식효율 개선
 - 비타민제 지원 : 324백만원, CCTV 지원 : 162백만원
- 조사료 가공시설(경주축협 TMR 사료공장) 증축 : 1,800백만원

□ 향후계획

- 브랜드 참여농가 증대를 위한 기자재 지원, 고급육 생산 지원 추진
- 연간 6만톤 생산가능 한 설비 구축으로 사료비 절감 및 생산성 향상

관련부서

주관부서	축산정책과	과장	백승준(6290)	축산물유통팀장	정석수(6296)	담당자	박진포(6299)
------	-------	----	-----------	---------	-----------	-----	-----------

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
계속	예산	임기내	경주시	이행후 계속추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 관내
- 사업기간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 50억원(도비 5, 시비 30, 자부담 15)
- 사업내용
 - 깨끗한 축산농장 지정 확대(매년 6호)
 - 친환경 악취제거제 공급(15억원)
 - 축산악취 제거(저감)시설 지원(35억원)
- 연도별 추진목표 〈단위 : 백만원〉

2022	2023	2024	2025	2026
900	900	1,000	1,000	1,200

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구분	확보액					집행액					비고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	2,800	0	900	900	1,000	2,100	0	900	900	300	
국비	0					0					
도비	280		90	90	100	180		90	90		
시비	1,680		540	540	600	1,380		540	540	300	
기타	840		270	270	300	540		270	270		

□ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 50%
- 2024년 추진목표 달성 여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

○ 2022년도

- 깨끗한 축산농장 지정 완료(8개소)
- 축종별 친환경 악취제거제 공급(2.5억원) - 민원발생농가 긴급 지원
- 축사악취제거시설 지원(52개소, 5.5억원)

○ 2023년도

- 깨끗한 축산농장 추가 지정완료(5개소)
-한우 2호, 젓소 1호, 돼지 1호, 양계 1호
※ 지정현황(누계 74호) : 한·육우 51호, 젓소 7호, 돼지 7호, 양계 9호
- 축종별 친환경 악취제거제 공급 완료(3억원)
- 민원다발지역(안강읍 육통리, 노당리)에 우선 공급
- 축사악취저감시설 지원(50개소, 6억원)
- 음용수처리기, 환기시설, 쿨링패드, 안개분무, 집진시설 등

○ 2024년도

- 깨끗한 축산농장 지정 진행 중 / 5개소 현장평가 완료
- 축종별 친환경 악취제거제 공급 완료(3억원)
- 축사악취저감시설 지원 추진 중(60개소, 7억원)
- 음용수 처리기 등 30개소 4억원 사업 완료

관련부서	주관부서	축산정책과	과장 백승준(6290)	친환경축산팀장 김용배(6304)	담당자 장승규(6309)

41

농어촌 체험마을 조성 및 맞춤형 정착 지원

신규여부 신규	예산구분 예산	완료시기 임기내	사업주체 경주시	추진상황 정상추진
------------	------------	-------------	-------------	--------------

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 내남면 상신리 일원(신농업혁신타운 내)
- 사업기간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 70억원 (국비 35, 시비 21, 시비 14)
 - ※ 지방소멸대응기금 선정(사업명: 귀농귀촌 웰컴팜교육지원센터 조성)
- 사업내용 : 귀농귀촌 희망자 체류 시설 및 경주시 정착을 위한 종합교육 제공
- 연도별 추진목표

	2022	2023	2024	2025	2026
사업타당성 분석		사전행정 절차 이행	실시설계용역 시행 및 건축공사 착공	건축공사 준공	귀농귀촌 희망자 입소, 교육 및 프로그램 운영

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액					집 행 액					비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	7,000	0	0	7,000	0	250	0	0	170	80	
국 비	3,500	0	0	3,500		250	0	0	170	80	
도 비	2,100	0	0	2,100		0	0	0	0	0	
시 비	1,400	0	0	1,400		0	0	0	0	0	
기 타	0					0					

□ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 35%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2022. 05. 27. : 경주시 지방소멸대응기금 투자계획서 제출
- 2022. 08. 16. : 인구정책 지방소멸대응기금 35억원 확보(행안부)
- 2022. 06. ~ 2022. 11. : 사업타당성 조사용역 추진
- 2023. 01. ~ 2023. 03. : 2023년도 제1차 도 투자 심사결과 통보
- 2023. 03. ~ 2023. 04. : 시 공유재산 심사결과 통보
- 2023. 04. ~ 2023. 06. : 공공건축 사전검토 신청 및 의견통지
- 2023. 07. ~ 2023. 08. : 공공건축 심의 신청 및 검토
- 2023. 08. ~ 2023. 09. : 일상감사, 도 원가심사, 제안공모 심사위원 위촉 추진
- 2023. 09. ~ 2023. 12. : 제안공모 준비 및 운영, 계약 등 추진
- 2023. 12. ~ 2024. 06. : 웰컴팜 교육지원센터 실시설계 용역

□ 향후계획

- 2024. 07. ~ 08. : 설계자문 및 공공건축 관련 협의 등 행정절차 이행
- 2024. 09. ~ 2025. 12. : 공사 착공 및 준공

관련부서	주관부서	농업진흥과	과장 이성미(8681)	농업시설TF팀장 하수진(2937)	담당자 우민정(2939)
	협조부서			교육훈련팀장 이효석(8689)	담당자 손호기(8724)

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
신규	예산	임기내	경주시	정상추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 내남면 상신리 782일원(신농업혁신타운 내)
- 사업기간 : 2022 ~ 2024년(3년)
- 총사업비 : 30억(국비 5, 시비 21, 기타 4)
- 사업내용 : 농산물 종합가공센터 건립(지상 1층, 893㎡)
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
관련기관 협의 및 설계	행정절차 이행 및 착공	준공 및 운영	-	-

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구분	확보액					집행액					비고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	3,000	0	400	1,500	1,100	2,857	0	104	460	2,293	
국비	1,200		200	300	700	2,655		104	258	2,293	
도비	0					0					
시비	1,400		200	800	400	202			202		
기타	400			400		0					

□ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 80%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2022. 1. ~ 12. : 관계기관 업무협약, 공정 및 실시설계
- 2023. 1. ~ 12. : 설계자문, 일상감사 등 행정절차 이행
- 2023. 11. : 건축 착공
- 2024. 6. : 건축 준공

□ 향후계획

- 2024. 7. ~ 9. : 공정표준화, 운영조례 제정, 인력충원
- 2024. 10. : 운영 개시

관 련 부 서	주관부서	농업진흥과	과장 이성미(8681)	농업시설TF팀장 하수진(2937)	담당자 박지영(2938)
	협조부서			생활자원팀장 김화정(8692)	담당자 장형욱(8693)

신규여부 계속	예산구분 예산	완료시기 임기내	사업주체 경주시	추진상황 이행후 계속추진
------------	------------	-------------	-------------	------------------

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 1,700백만원(시비 1,400, 자부담 300)
- 사업내용
 - 농업기술과 : 친환경 농산물 단지조성 및 생산기술 전문화 (10억)
 - 농업정책과 : 친환경농업 장려금 지급 (7억)
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
· 친환경 농산물 단지 조성 · 친환경농업 전문기술 교육 · 친환경농업 장려금 지급	· 친환경 농산물 단지 조성 · 친환경농업 전문기술 교육 · 친환경농업 장려금 지급	· 친환경 농산물 단지 조성 · 친환경농업 전문기술 교육 · 친환경농업 장려금 지급	· 친환경 농산물 단지 조성 · 친환경농업 전문기술 교육 · 친환경농업 장려금 지급	· 친환경 농산물 단지 조성 · 친환경농업 전문기술 교육 · 친환경농업 장려금 지급

□ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액					비고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	800	0	264	268	268	552	0	264	268	20	
국비	0		-	-	-	0		-	-	-	
도비	0		-	-	-	0		-	-	-	
시비	746		246	250	250	516		246	250	20	
기타	54		18	18	18	36		18	18	-	

□ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 50%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2022년 : 270백만원 완료
 - 친환경 농산물 단지 조성 : 100백만원(하우스 기자재, 영양제 등)
 - 친환경농업 전문 기술교육 : 20백만원(10회, 300명)
 - 친환경농업 장려금 지급(연2회) : 150백만원(170농가, 210ha)
- 2023년 : 250백만원 완료
 - 친환경 농산물 단지 조성 : 80백만원(하우스 시설개선, 친환경 기자재 등)
 - 친환경농업 전문 기술교육 : 20백만원(10회, 247명)
 - 친환경농업 장려금 지급(연2회) : 150백만원(179농가, 205ha)
- 2024년 : 100백만원(추진중)
 - 친환경 농산물 단지 조성 : 80백만원(하우스 시설개선, 친환경 기자재 등)
 - 친환경농업 전문 기술교육 : 20백만원(5회, 160명)
 - 친환경농업 장려금 지급(하반기)

□ 향후계획

- 친환경 재배면적 단계적 확대 : GAP 기반 → 무농약 · 유기농 추진
- 작목별 친환경단지 조성 확대 : 4품목 → 5품목
 - (현재) 벼, 고추, 곤달비, 사과 → (향후) 기존 4품목 + 고사리
- 친환경농업 장려금 지급 홍보를 통해 친환경인증 유도
- 친환경 먹거리 생산 + 판매 시스템 확립 및 로컬푸드 허브체계 구축

□ 현황사진



관련부서	주관부서	농업정책과	과장 고영달(6270)	원예산업팀장 김현우(6995)	담당자 정희영(6998)
	협조부서	농업기술과	과장 김정필(8710)	경제작물팀장 이승찬(8716)	담당자 김민영(8717)

44-1

어촌뉴딜 300사업 추진 확대

신규여부 계속	예산구분 예산	완료시기 임기내	사업주체 경주시	추진상황 이행후 계속추진
-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------------

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 양남면, 감포읍 일원
- 사업기간 : (계획) 2019년 ~ 2024년 / (추진)2019년 ~ 2025년
- 총사업비 : 413억원(국비 289, 도비 37, 시비 87)
 - 수렴항(111억원), 나정항(73억원), 연동항(75억원), 척사항(68억원), 가곡항(86억)
- 사업내용 : 공통사업, 특화사업, 역량강화사업 등
 - 공통사업 : 방파제 정비, TTP 보강, 안전시설 설치 등
 - 특화사업 : 마을(어촌계)회간 리모델링, 정주환경 개선, 주민소득사업 등
 - 역량강화 : 교육·훈련, 컨설팅, 사무장 채용, 지역협의체 운영 등
- 연도별 추진계획

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
수렴항	준공				-	-
나정항	실시설계 수립	준공				
연동항	실시설계 수립	준공				
척사항	기본계획 수립	실시설계 수립	착공	준공		
가곡항		기본계획 수립	실시설계 수립	착공	준공	

□ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	확 보 액					집 행 액					비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	41,347	22,320	9,004	5,815	4,208	34,074	22,320	9,004	2,742	8	
국 비	28,943	15,624	6,303	4,071	2945	23,851	15,624	6,303	1,919	5	
도 비	3,721	2,009	810	523	379	3,067	2,009	810	247	1	
시 비	8,683	4,687	1,891	1,221	884	7,156	4,687	1,891	576	2	
기 타	0					0					

□ **추진현황 : 이행후 계속추진**

○ 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 80%

○ 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

※지방항 10개중 5개소 선정으로 전국 최다

□ **추진경과(주요성과)**

○ 2018. 12. : 2019년 해양수산부 공모사업 선정(수렴항)

○ 2019. 08. : 수렴항 어촌뉴딜 300사업 기본계획 해양수산부 승인

○ 2019. 08. : 수렴항 어촌뉴딜 300사업 착공

○ 2019. 12. : 2020년 해양수산부 공모사업 선정(나정항, 연동항)

○ 2020. 09. : 나정항·연동항 어촌뉴딜 300사업 기본계획 해양수산부 승인

○ 2020. 12. : 2021년 해양수산부 공모사업 선정(척사항)

○ 2021. 08. : 나정항·연동항 어촌뉴딜 300사업 착공

○ 2021. 09. : 척사항 어촌뉴딜 300사업 기본계획 해양수산부 승인

○ 2021. 12. : 2022년 해양수산부 공모사업 선정(가곡항)

○ 2021. 12. : 수렴항 어촌뉴딜 300사업 준공식 개최

○ 2022. 09. : 수렴항 어촌뉴딜 300사업 준공

○ 2022. 11. : 척사항 어촌뉴딜 300사업 착공

○ 2022. 11. : 가곡항 어촌뉴딜 300사업 기본계획 해양수산부 승인

○ 2022. 12. : 나정항·연동항 어촌뉴딜 300사업 준공

○ 2023. 1. ~ 12. : 척사항 어촌뉴딜 300사업 공사 추진

○ 2023. 1. ~ 12. : 가곡항 어촌뉴딜 300사업 실시설계 용역 시행

○ 2024. 06. : 척사항 어촌뉴딜 300사업 준공

□ **향후계획**

○ 2024. 08. : 가곡항 어촌뉴딜 300사업 기본계획 변경 및 실시설계 수립 완료

○ 2024. 09. : 가곡항 어촌뉴딜 300사업 착공

○ 2025. 12. : 가곡항 어촌뉴딜 300사업 준공

관련 부서	주관부서	해양수산과	과장 윤창호(6310)	수산지원팀장 백승한(6316)	담당자 황규철(6317)

44-2

감포항 명품어촌 테마마을 조성

신규여부 계속	예산구분 예산	완료시기 임기내	사업주체 경주시	추진상황 이행후 계속추진
-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------------

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 감포항 일원(경주시 감포읍 감포리 505-66번지)
- 사업기간 : 2019 ~ 2025년
- 총사업비 : 9,050백만원(국 6,335, 시 2,715)
- 사업내용 :
 - 기초생활기반확충 : 용오름광장, 감포역사문화마당, 선큰마당
 - 지역경관개선 : 송대말 등대주변 경관개선, 감포항 트레일 조성
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
실시설계	공사 착공	공사 진행	공사 준공	

□ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	확 보 액					집 행 액					비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	9,050	5,560	1,971	1,519	0	5,385	1,945	318	2,783	339	
국 비	6,335	3,892	1,380	1,063		3,640	1,400	223	1,678	339	
도 비	0					0					
시 비	2,715	1,668	591	456		1,745	545	95	1,105		
기 타	0					0					

□ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 60%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2018. 12. : 해양수산부 공모사업 선정(명품어촌테마마을 선정)
- 2019. 12. : 기본 및 경관계획 용역 착수, 기술지원자문단 자문
- 2021. 12. : 기본 및 경관계획 용역 완료
- 2022. 2. : 기본계획 승인
- 2022. 5. : 실시설계용역 착수
- 2023. 3. : 시행계획(1차) 승인
- 2023. 6. : 비지정권자 어항개발사업 허가(용오름광장)
- 2023. 8. : 공사 착공 ※ 감포항 태풍피해 복구공사와 동시에 추진
- 2023. 12. : 시행계획(2차) 승인

□ 향후계획

- 2024. 8. : 용오름광장 조성완료
- 2024. 9. : 선큰마당 조성완료
- 2024. 11. : 송대말 등대주변 경관개선 완료
- 2024. 12. : 전체공정 공사준공

□ 문제점 및 대책

- 도시공원과에서 보상협의를 토지소유자의 사유지 성토요구로 인한 민원으로 송대말 등대주변 경관개선사업 공사가 다소 지연됨.
- 사업에 대한 충분한 설명등을 통하여 조속한 기간내 준공될 수 있도록 노력하겠음.

관련부서

주관부서	해양수산과	과장 윤창호(6310)	해양산업팀장 이종탁(6325)	담당자 변전우(6328)
------	-------	--------------	------------------	---------------

44-3

감포나정, 양남하서 연안정비사업

신규여부 계속	예산구분 예산	완료시기 임기 후	사업주체 경주시	추진상황 이행후 계속추진
-------------------	-------------------	---------------------	--------------------	-------------------------

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 감포읍 나정지구 / 양남면 하서1리-1지구
- 사업기간 : 2020년 ~ 2028년
- 총사업비 : 426억원 (균특 298, 도비 38, 시비 90)
 - ※ 나정지구 : 240억원(균특 168, 도비 22, 시비 50)
 - ※ 하서1리-1지구 : 186억원(균특 130, 도비 16, 시비 40)
- 사업내용 : 수중방파제, 방사제, 이안제, 호안정비 등
 - ※ 나정지구 : 수중방파제 L=189m, 월파벽 설치 L=38m, T.T.P 보강 L=66m
 - ※ 하서1리-1지구 : 수중방파제 L=90m, 저천단이안제 L=50m, 방사제 L=50m, 호안보수 L=343m
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
실시설계용역 추진	공사 진행	공사 진행	공사 진행	공사 진행

□ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	확 보 액					집 행 액					비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	12,077	3,772	1,691	2,900	3,714	6,539	1,516	0	2,435	2,588	
국 비	8,454	2,640	1,184	2,030	2,600	4,589	1,061	-	1,705	1,823	
도 비	1,087	340	152	261	334	589	136	-	219	234	
시 비	2,536	792	355	609	780	1,361	319	-	511	531	
기 타	0					0					

□ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 15%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2020. 6. : 해양수산부 제3차 연안정비기본계획 고시
- 2021. 3. : 하서1리-1지구 연안정비사업 실시설계용역 착수
- 2021. 5. : 나정지구 연안정비사업 실시설계용역 착수
- 2022. 2. : 나정지구 연안정비사업 주민설명회 개최 (총 3회)
- 2022. 6. : 하서1리-1지구 연안정비사업 주민설명회 개최 (총 3회)
- 2023. 4. : 하서/나정 연안정비사업 특허공법(소파블록)심의 완료
- 2023. 4. : 하서/나정 연안정비사업 경제성평가 완료
- 2023. 9. ~ 12. : 하서/나정 연안정비사업 관련 심의 및 협의 진행
- 2023. 12. : 하서1리-1/나정지구 연안정비사업 실시설계용역 준공
- 2023. 12. : 하서1리-1/나정지구 연안정비사업 공사 발주 및 착공
- 2024. 2. : 하서1리-1/나정지구 연안정비사업 기술지도용역 시행
- 2024. 4. : 하서1리-1/나정지구 연안정비사업(1차분) 발주
- 2024. 6. : 나정지구 연안정비사업(2차분) 발주

□ 향후계획

- 2024. 8. : 하서1리-1지구 연안정비사업(2차) 발주
- 2024. 12. : 하서1리-1지구/나정지구 연안정비사업(1차) 준공
- 2025. 12. : 나정지구 연안정비사업(2차) 준공
- 2028. 12. : 하서1리-1지구/나정지구 연안정비사업(총괄) 준공
- 2029. 1. : 하서1리-1지구/나정지구 연안정비사업 통합건설사업관리 용역 준공

□ 문제점 및 대책

- 대규모 사업비 확보 애로에 따른 해양수산부와의 지속적인 협의 및 예산 확보 방안을 마련하도록 노력하겠음

관련부서	주관부서	해양수산과	과장 윤창호(6310)	연안관리 팀장 이재화(6321)	담당자 이상영(6322)

44-4

수산물 가공시설 및 씨푸드 직판장 건립

신규여부 계속	예산구분 예산	완료시기 임기내	사업주체 경주시/민자	추진상황 이행후 계속추진
-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년(4년간)
- 총사업비
 - (계획) 30억원(도비 9, 시비 9, 자부담 12)
 - (추진) 42억원(국비 1.5 도비 12.5, 시비 13.9, 자부담 14.2)
- 사업내용 : 수산물 가공시설 및 씨푸드 직판장 건립 지원
 - 수산물 산지 가공시설 지원(5개소/3,901백만원)
 - ※ 수산물 산지(오징어, 가지미, 해파리 등) 가공시설 지원(3개소/2,501백만원)
 - 수산물 산지(젓갈) 가공시설 지원(2개소/1,400백만원)
 - 씨푸드 직판장 건립 지원(1개소/300백만원)
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
계획수립 및 착수	준공 및 운영	준공 및 운영	준공 및 운영	

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액					집 행 액					비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	4,201	0	2,141	1,460	600	700	0	300	400	0	
국 비	150	-	150			150	-	150	-		
도 비	1,245	-	495	450	300	165	-	45	120		
시 비	1,385	-	635	450	300	225	-	105	120		
기 타	1,421	-	861	560		160	-		160		

□ **추진현황 : 이행후 계속추진**

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 50%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ **추진경과**

- 2022. 04. : 수산물 산지(오징어, 가자미 등) 가공시설 지원 선정
- 2023. 03. : 수산물 산지(젓갈) 가공시설 지원 2개소 선정
 - ※ 2024.03. 수산물 산지(젓갈) 가공시설 지원 사업포기((주)유포)
- 2023. 06. : 수산물 산지(가자미 등) 가공시설 건립 완료
- 2023. 11. : 씨푸드 직판장 건립 준공
- 2024. 03. : 수산물 산지(해파리) 가공시설 지원 1개소 선정

□ **향후계획**

- 2024. 08. : 수산물 산지(젓갈) 가공시설 1개소 보조금 교부결정
- 2024. 12. : 수산물 산지 가공시설 2개소 사업 완료
 - ※ 수산물(오징어) 가공공장 건립(1개소), 젓갈공장 건립(1개소)
- 2025. 06. : 수산물 산지 가공시설 1개소 사업 완료
 - ※ 수산물(해파리) 가공공장 건립(1개소)

관련부서	주관부서	해양수산물과	과장 윤창호(6310)	수산지원팀장 백승한(6316)	담당자 김기태(6318) 양인후(2946)
	협조부서			해양산업팀장 이종탁(6325)	담당자 변전우(6328)

신규여부 계속	예산구분 예산	완료시기 임기내	사업주체 경주시	추진상황 정상추진
------------	------------	-------------	-------------	--------------

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 감포읍 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년(4년)
- 총사업비 : (계획) 10억원(시 10) / (추진) 9억원(시 9)
- 사업내용
 - 기념행사(7억)
 - 감포항 개항 100주년 기념식, 상설음악회, 사진전, 깎지길 걷기, 야간 풍등 날리기, 바다음식 축제, 선상 족구대회 등
 - 기념사업(2억)
 - 100주년 기념조형물 재설치
- ※ '20 설치 완료 후 제10호 태풍 '하이선'으로 조형물 피해 발생, 상·하부 분리 후 제작 공장에 보관 중
- 사업주체 : 경주시
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
기초자료 수집	- 추진위원회 구성 및 운영 - 기념조형물 재설치 착수	- 기념조형물 재설치 완료 - 벤치마킹 - 사업내용 선정	기념식 추진	

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구분	확보액					집행액					비고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	200	0	0	200	0	187	0	0	187	0	
국비	0					0					
도비	0					0					
시비	200			200		187			187		
기타	0					0					

□ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 30%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여


□ **추진경과(주요성과)**

- 2016. 11. : 기념사업 준비위원회 출범
- 2017. 12. : 기념사업 기본계획 용역 완료
- 2018. 09. : 기념사업 추진위원회 구성
- 2019. 06. : 기념조형물 설치 착수
- 2019. 07. : 기념사업 2025년도로 연기 ※ 개항년도 1925년으로 판명
- 2020. 02. : 기념조형물 설치 준공
- 2020. 09. : 제10호 태풍 ‘하이선’ 으로 인한 피해 이후 조형물을 분리하여 제작 공장 보관
- 2023. 07. : 「기념조형물 보수 및 재설치」 사업 원가계산 용역 실시·완료
- 2023. 09. : 기념조형물 보수 및 재설치 착수
- 2023. 09. : 기념사업 세부사업 수립 용역 착수
- 2023. 12. : 기념사업 추진위원회 구성 완료
- 2024. 02. : 기념사업 세부사업 수립 용역 완료

□ **향후계획**

- 2024. 08. : 기념조형물 보수 및 재설치 완료

□ **관련사진**

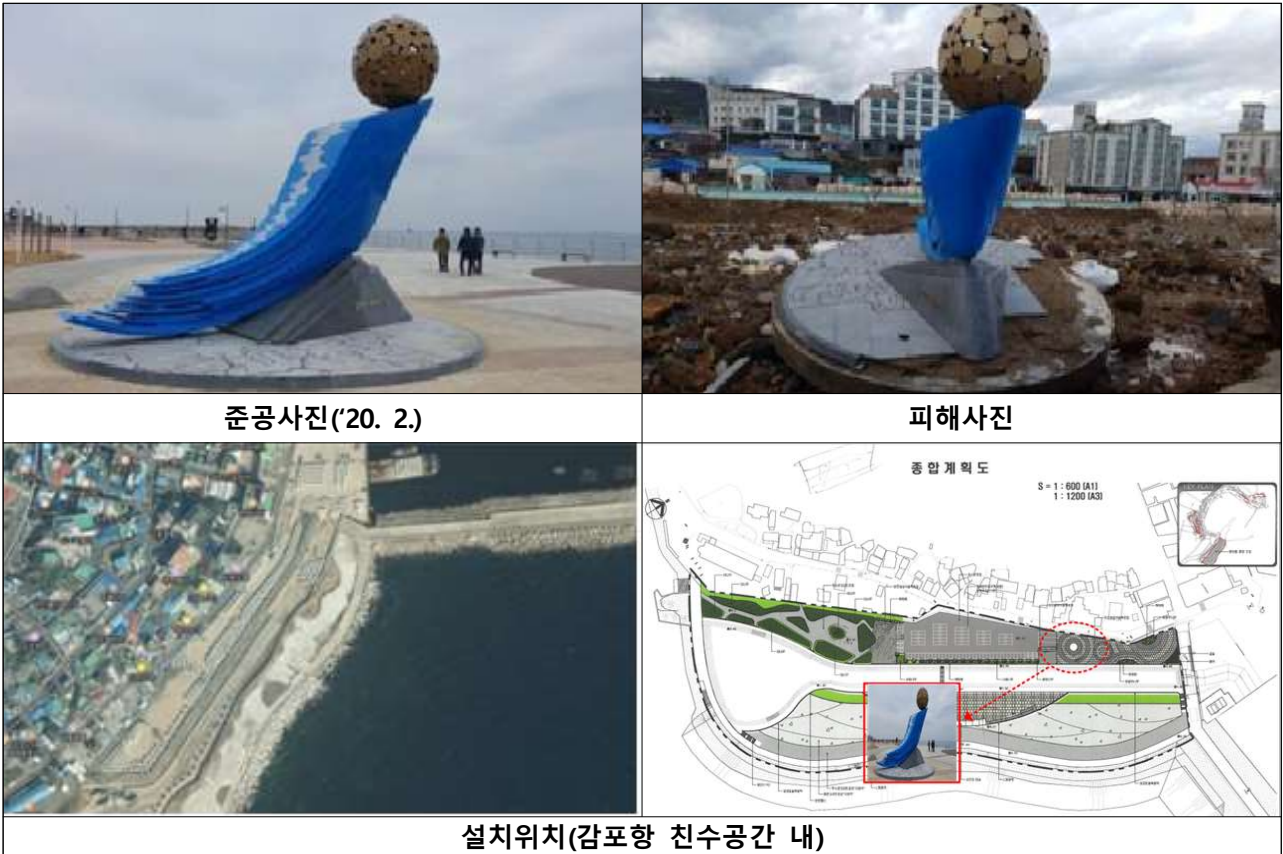

관련부서	주관부서	해양수산과	과장	윤창호(6310)	수산지원팀장	백승한(6316)	담당자	황규철(6317)
		미래전략실	실장	윤병록(6800)	미래산업팀장	서영호(6808)	담당자	하예린(6810)
	협조부서	감포읍	읍장	김민대(8000)	총무팀장	강선희(8001)	담당자	서후경(8003)
